

For official purpose only
सरकारी उपयोग हेतु



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केंद्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION

स्थिति प्रतिवेदन (2023-24)
STATUS REPORT (2023-24)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत
कमान्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना
CAMAND AREA DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT (CADWM)
UNDER PRADHAN MANTRI KRASHI SINCHAI YOJANA

ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना OMKARESHWAR IRRIGATION PROJECT

प्रबोधन और पुनासा निदेशालय
MONITORING AND PUNASA DIRECTORATE
नर्मदा बेसिन संगठन
NARMADA BASIN ORGANISATION
भोपाल / BHOPAL

जनवरी 2024 / JANUARY 2024

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
भाग-I	कार्यकारी सारांश (Executive summary)	05
भाग-II	प्रबोधन प्रतिवेदन (Status Report)	09
I	समग्र ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना	12
II	पर्यावरण और वन निकासी/मंजूरी:	11
III	गुणवत्ता नियंत्रण:	11
IV	CADWM कार्य का भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति	11
V	राज्य/परियोजना स्तर पर परियोजना की निगरानी	15
VI	प्रमुख मुद्दे	15
VII	CADWM के कार्यान्वयन में बाधाएं	16
VIII	पूर्व स्थिति रिपोर्ट में CWC के अवलोकन की अनुपालन रिपोर्ट	16
भाग -III	अनुलग्नक (Annexure)	17
I	निरीक्षण यात्रा विवरण	18
II	मुख्य विशेषताएं	19
III	परियोजना प्राधिकरण का संगठन ढांचा	25
IV	भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति	26
भाग -IV	प्लेट (Plates)	35
I	प्लेट-I	36
II	प्लेट-II	37
III	प्लेट-III	38
भाग -V	छायाचित्र (Photograph)	39
I	I	40
II	II	41
III	III	42
IV	IV	43

संकेताक्षर


AIBP	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
BCM	अरब घन मीटर
CA	केंद्रीय सहायता
CADWM	कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन
CCA	कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र
CLA	केंद्रीय ऋण सहायता
CUMECs	घन मीटर प्रति सेकंड
CWC	केंद्रीय जल आयोग
DM	डायरेक्ट मायनर
DoWR, RD&GR	जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण
DWC	डबल दीवार नालीदार
EC	अनुमानित लागत
FC	फील्ड चैनल
GoMP	मध्य प्रदेश शासन
Ha	हेक्टेयर
HDPE	उच्च घनत्व पॉलीथीन पाइप
IP	सिंचाई क्षमता
IPC	सिंचाई क्षमता सृजित
IPU	उपयोग की गई सिंचाई क्षमता
KM	किलोमीटर
LA	भूमि अधिग्रहण
LBC	बाईं तट नहर
LTIF	दीर्घकालीन सिंचाई कोष
M	मीटर
MCM	मिलियन क्यूबिक मीटर
MI	सूक्ष्म सिंचाई
M&A	प्रबोधन और मूल्यांकन
MJS	जल शक्ति मंत्रालय
MoEF	पर्यावरण और वन मंत्रालय
NABARD	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NBO	नर्मदा बेसिन संगठन
PL	मूल्य स्तर
PMKSY	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
RBC	दायां तट नहर
RD	कम दूरी

R&R	पुनःस्थापन और पुनर्वास
RCE	संशोधित लागत अनुमान
SDO	उपमण्डल अधिकारी
TEC	कुल अनुमानित लागत
UIP	परम सिंचाई क्षमता
WRD	जल संसाधन विभाग
WUA	जल उपभोक्ता संघ

भाग-I/(Part-I)
कार्यकारी सारांश
(Executive Summary)

कार्यकारी सारांश (कमांड क्षेत्र विकास):-

ऑकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता गांव के निकट नर्मदा नदी पर किया गया है। बांध स्थल ऑकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है। बांध स्थल इंदौर से लगभग 77 किमी की दूरी पर है। परियोजना में गेटेड स्पिलवे के साथ 73 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण किया गया है। परियोजना 1,46,800 हेक्टेयर सीसीए (वार्षिक सिंचाई 2,83,324 हेक्टेयर) की सिंचाई के साथ 520 मेगावाट (65 मेगावाट की 8 इकाइयां) बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित की गयी है। परियोजना की योजना मध्य प्रदेश के खंडवा (क्षेत्र 12710 हेक्टेयर), खरगोन (58744 हेक्टेयर) और धार (क्षेत्र 75346 हेक्टेयर) जिलों में सिंचाई प्रदान करने की है। परियोजना के अतिरिक्त घटक अर्थात् नर्मदा मालवा गंभीर लिंक (NMGK) और नर्मदा-क्षिप्रा नदी लिंक (NKSL) परियोजना का हिस्सा हैं। कई घटकों में से बांध और नहर केवल एआईबीपी वित्त का हिस्सा हैं। परियोजना के एआईबीपी भाग को तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा मंजूरी दी गई थी और तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मई 2001 में 1784.29 करोड़ (1993 PL) रुपये की अनुमानित लागत के लिए स्वीकार किया गया था। इसके अंतर्गत यूनिट- II नहर की लागत 708.00 करोड़ रुपये है। यह परियोजना 1993 में शुरू की गई थी; हालाँकि, वित्तीय संकट के कारण परियोजना का निर्माण कार्य जारी नहीं रखा जा सका। ऑकारेश्वर परियोजना इकाई-II (नहर) की संशोधित अनुमानित लागत 2504.80 करोड़ रुपये है। (कार्य घटक की लागत 2290.74 करोड़ रुपये है) (2009 PL) जिसके लिए योजना आयोग द्वारा पत्र संख्या 2(290)/2010-डब्ल्यूआर दिनांक 27.09.2010 के तहत निवेश मंजूरी प्रदान की गई थी। निवेश निकासी की वैधता मार्च 2014 तक थी। इसे योजना आयोग द्वारा पत्र संख्या 2(290)/2010-डब्ल्यूआर दिनांक 22.02.2014 से मार्च 2015 तक और पत्र संख्या 2(290)/2010-डब्ल्यूआर दिनांक 01.09.2014 के माध्यम से मार्च 2017 तक आगे बढ़ाया गया था।

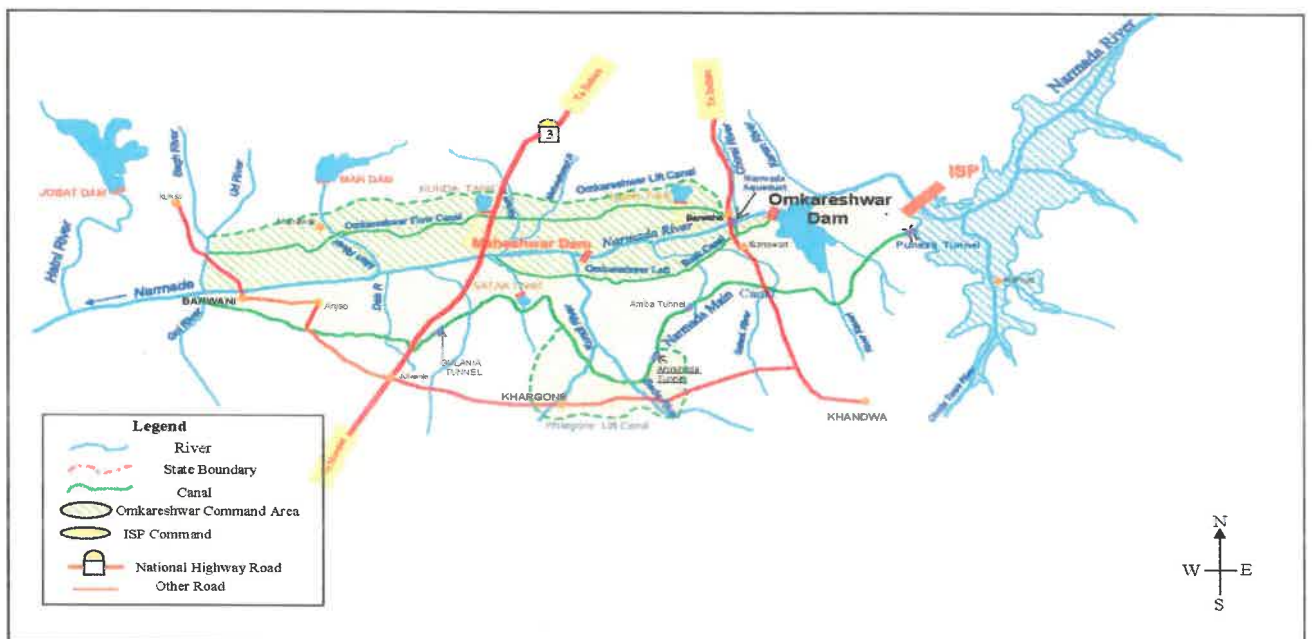


- आँकारेश्वर परियोजना -

ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना के मुख्य घटक :-

यूनिट I बांध और यूनिट III पावर हाउस: परियोजना से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करने के लिए, यूनिट I - डैम और यूनिट III - पावरहाउस का निर्माण कार्य एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएचडीसी) को सौंप दिया गया था। बांध और बिजलीघर का काम वर्ष 2003-04 में शुरू किया गया था बांध बनकर तैयार हो चुका है। सभी 8 (आठ) इकाइयों (प्रत्येक 65 मेगावाट की दर से) की कमीशनिंग के साथ यूनिट III पावर हाउस का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

यूनिट II नहर घटक: ओंकारेश्वर परियोजना में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए चार चरण शामिल हैं सभी 4 चरण 2,83,324 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई के साथ सीसीए के 1,46,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं, विभिन्न चरणों के सीसीए और आईपी के चरणवार विवरण निम्नानुसार हैं:

OSP Phase	CCA in ha	IP in ha
Phase I	24000	46320
Phase II	19578	37786
Phase III	48592	93782
Phase IV	54630	105436
Total	1,46,800	2,83,324

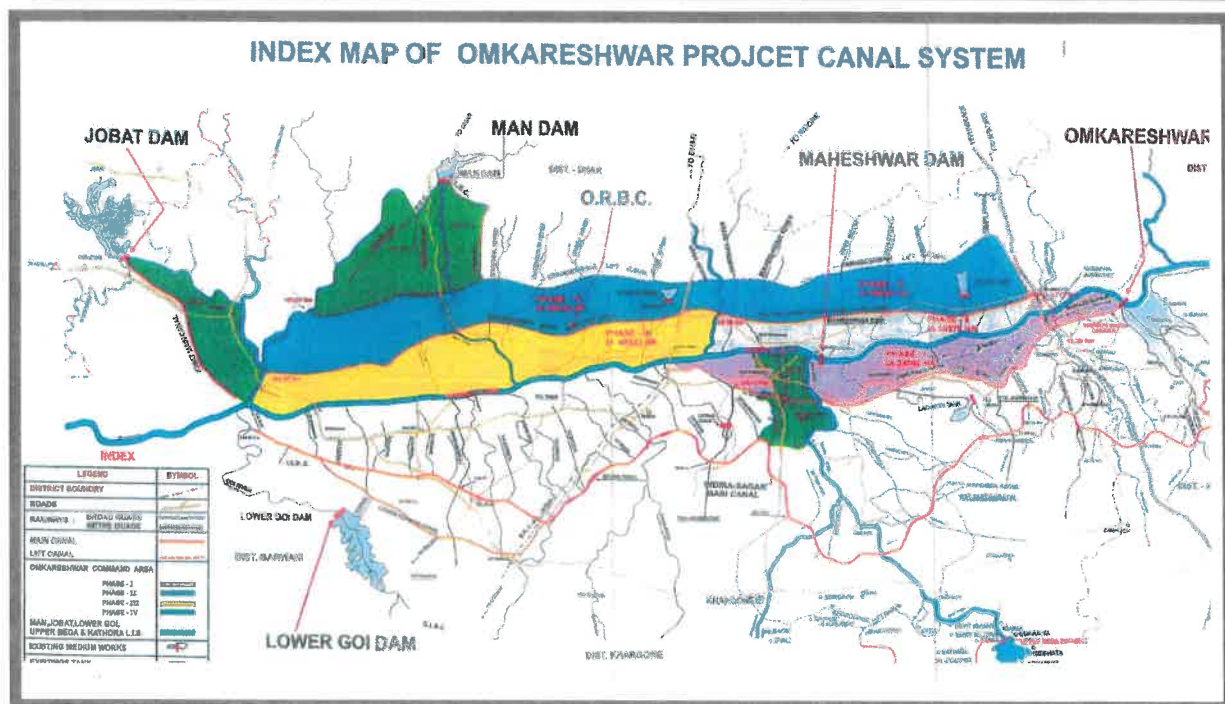

ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना का चरण सहित चित्रण

CADWM के अंतर्गत कार्य

समग्र रूप से OSP परियोजना को 2015-16 में तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय के PMKSY CADWM कार्यक्रम के तहत पत्र संख्या G/19011/5/2015-CADWM दिनांक 23.02.2016 के तहत 648.09 करोड़ की कुल लागत और CCA 146800 हेक्टेयर दो साल के लिए शामिल किया गया था। नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार कार्यों को मार्च, 2024 तक पूरा करने की योजना है। चरण-I के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 24000 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 79.652 Cr. रुपये है, चरण-II के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 19578 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 68.24 Cr. रुपये है। चरण-III के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 48592 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 169.570 Cr. रुपये है। चरण-IV के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 54630 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 326.63 Cr. रुपये है।

चरण	चरण के अंतर्गत कार्य	प्रारम्भिक CCA हेक्टेयर में	संशोधित CCA हेक्टेयर में	प्रगति	जल उपभोक्ता संस्था
I	a) Common Water Carrier. (0.0 km to 12.39 km) b) RBC (0.0 km to 9.77 km)	960 + 2460 total=3420	3589	3076	02
	LBC (0.0 km to 64.11km)	20580	20580	13295	12
II	RBC (9.77 km to 68.92 km)	19578	15800	13876	10
III	RBC (68.92 km to 162.70 km)	48592	41257	15124	28
IV	RBC (Lift Canal) (0.0 km to 51.28 km)	54630	28073	10680	14
	RBC (Lift Canal) (51.28 km to 125.00 km)		29947	0	15
Total				56052	81


भाग-II/(Part-II)
प्रबोधन प्रतिवेदन
(Monitoring Report)

ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)

ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना (OSP) मध्य प्रदेश के कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन की 2023-24 अवधि के लिए स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत है यह रिपोर्ट श्री करण सिंह सैनी, उप निदेशक एवं श्री मनीष शर्मा, सहायक निदेशक प्रबोधन एवं पुनासा निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल द्वारा 06 से 08 दिसम्बर 2023 के दौरे के दौरान परियोजना अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के आधार पर तैयार की गई है। परियोजना की ओर से श्री एम. के. शिवहरे, कार्यपालन यंत्री मंडलेश्वर, श्री आर.पी. उईके, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, श्री गोकुलसिंह चौहान, सहायक यंत्री (मैदानी) नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, श्री आर.के. नैना, उपयंत्री, श्री व्हाय.एस. आकरे, उपयंत्री, दिनेश यादव, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संथा क्र. 01 बेगन्दा, श्री आशीष शिवहरे कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद, श्री विजय वास्केल अनुविभागीय अधिकारी ओ.एस.पी. नहर उपसंभाग धरमपुरी, श्री विक्रम अवाश्या अनुविभागीय अधिकारी ओ.एस.पी. नहर उपसंभाग धामनोद, श्री एम. सी. गुप्ता उपयंत्री, श्री एम. बी. वर्मा उपयंत्री, श्री एन. के. आर्य उपयंत्री, श्री आनंद जायसवाल उपयंत्री, श्री सुगनचंद जाट अध्यक्ष जल उपभोक्ता संथा क्रमांक 08 के साथ-साथ NVDA के अन्य अधिकारी परियोजना के निरीक्षण दौरे में अतिथि अधिकारियों के साथ थे।

समग्र ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना:

ओम्कारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता गांव के निकट नर्मदा नदी पर किया गया है। बांध स्थल ओम्कारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है। बांध स्थल इंदौर से लगभग 77 km की दूरी पर है। परियोजना में गेटेड स्पिलवे के साथ 73 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण किया गया है परियोजना 1,46,800 Hac. CCA (वार्षिक सिंचाई 2,83,324 Hac.) की सिंचाई के साथ 520 MW (65 MW की 8 Units) बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित की गयी है परियोजना की योजना मध्य प्रदेश के खंडवा (क्षेत्र 12710 Hac.), खरगोन (58744 Hac.) और धार (क्षेत्र 75346 Hac.) जिलों में सिंचाई प्रदान करने की है। परियोजना के अतिरिक्त घटक अर्थात् नर्मदा मालवा गंभीर लिंक (NMGK) और नर्मदा-क्षिप्रा नदी लिंक (NKSL) परियोजना का हिस्सा हैं।

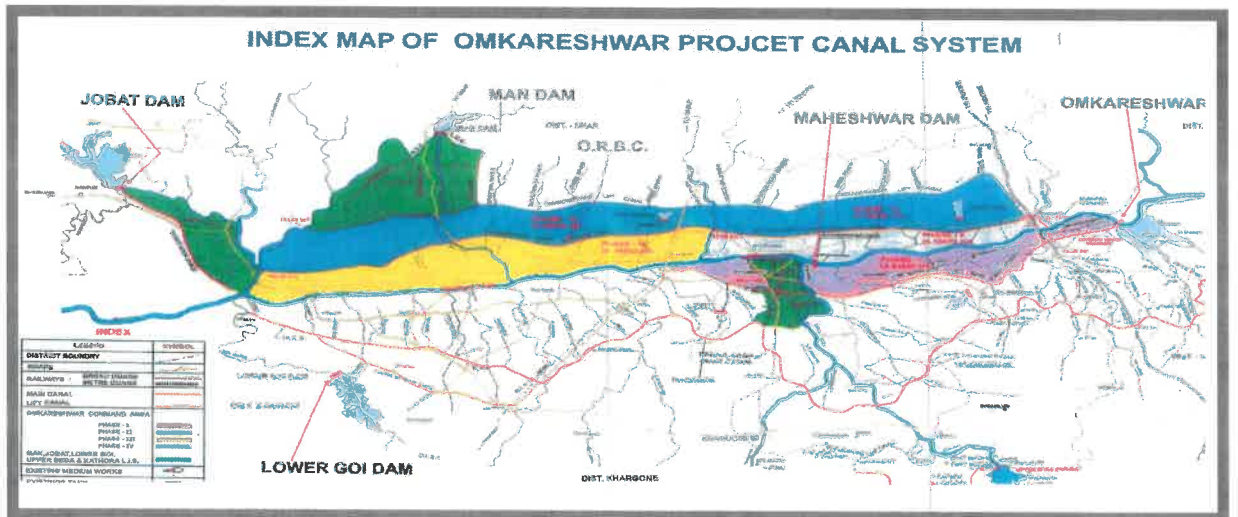

पर्यावरण और वन निकासी/मंजूरी:

ओंकारेश्वर परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जे-11016/5/84 दिनांक 13.10.1993 से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त है। ओंकारेश्वर परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8-29/91-एफसी (वॉल्यूम II) दिनांक 20.08.2004 से वन भूमि के डायवर्जन के लिए मंजूरी मिली है।

गुणवत्ता नियंत्रण:

परियोजना का गुणवत्ता नियंत्रण कार्य प्रारंभ में एक एजेंसी के माध्यम से किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 से गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य कार्यपालन यंत्री, एनवीडीए इंदौर द्वारा किया जा रहा है।

कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य का भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति:

समग्र रूप से OSP परियोजना को 2015-16 में MoWR, RD&GR के CADWM कार्यक्रम के तहत पत्र संख्या G/19011/5/2015-CADWM dated 23.02.2016 के तहत 648.09 करोड़ की कुल लागत और CCA 146800 हेक्टेयर दो साल के लिए शामिल किया गया था। नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार कार्यों को मार्च, 2024 तक पूरा करने की योजना है। चरण-I के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 24000 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 79.652 Cr. रुपये है, चरण-II के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 19578 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 68.24 Cr. रुपये है। चरण-III के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 48592 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 169.570 Cr. रुपये है। चरण-IV के तहत कवर किया गया कुल सीसीए 54630 हेक्टेयर है जिसकी अनुमानित लागत 326.63 Cr. रुपये है।

राज्य में, CADWM कार्य परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से जल उपयोगकर्ता संघों (WUA) द्वारा किए जा रहे हैं। चरण-I से IV में कुल 75 जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) का गठन किया गया है। अब तक, लगभग 56052 हेक्टेयर सीसीए को 113.16 करोड़ के व्यय पर फील्ड चैनलों के निर्माण और किसानों को प्रशिक्षण के साथ CADWM कार्यों के निर्माण किया गया है। चल रहे कार्य का WUA-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। OSP के CADWM कार्यों के लिए 2023-24 में 20.76 करोड़ की केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जल उपभोक्ता संस्था प्रगति:-

चरण	जल उपभोक्ता संस्था लक्ष्य	जल उपभोक्ता संस्था प्रगति:-		टिप्पणी
		कुल	% प्रतिशत	
फेज I, II, III एवं IV	81	75	92.59%	नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कारण CADWM का एरिया कम हुआ है जिस कारण संस्था भी 75 किया जाना प्रभावित है

संपूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना फेज (I से IV) वित्तीय प्रगति :-

लक्ष्य	प्रगति	% प्रतिशत	लक्ष्य 2023-24
648.09	113.16	17.46%	73.54

संपूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना फेज (I से IV) भौतिक प्रगति :-

लक्ष्य	प्रगति	% प्रतिशत	लक्ष्य 2023-24
1,46,800	56052	38.18%	31499

संपूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना फेज (I से IV) जारी केंद्रीय अनुदान CA

लक्ष्य	जारी CA प्रगति		लक्ष्य 2023-24
	प्रगति	% प्रतिशत	
323.57	36.7675	11.36%	20.76

केंद्रीय और राज्यवार वित्तीय प्रगति

क्रं	एजेंसी	प्रतिशत	MOU के अनुसार राशि	व्यय	केंद्रीय वित्तीय सहायता
1	केंद्र सरकार	50	323.5769	56.58	36.7675
2	राज्य सरकार	50	324.5121	56.58	-

WUA अनुसार संपूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना फेज (I से IV) भौतिक प्रगति :-

चरण	संभाग क्रमांक	जल उपभोक्ता संस्था	कुल क्षेत्र	विकसित क्षेत्र
चरण-I (भाग-I)	32 (सनावद)	मुरल्ला	2076	2002
		मोरड़ी	1513	1074
		कुल	3076	3076
चरण-II (भाग-II)	8 (बडवाह)	अलिबुजर्ग	2061	1054
		खेडी	2011	667
		बडूद	1799	564
		मोंगावा	1801	1591
		बकांवा	1504	1242
		भटयाण	2079	756
		लौंधी	1225	1260

चरण-II	20 (मंडलेश्वर)	भग्यापुर	1257	1023
		अमलाथा	2253	1326
		कोंगावा	1486	1043
		बड़गांव	1184	959
		जालनपुर	1920	1811
		कुल		13296
		बफलागाँव	1833	1689
		पिटा मली	1644	883
		पिपल्या	1742	914
		बहेगाँव	3463	2307
		सुलगांव	2040	948
		धरगांव	2041	1375
		ठनगांव	1729	1657
चरण-III	30 (मनावर)	केरियाखेड़ी	1472	1400
		जलकोटा	1600	1575
		खराड़ी	2014	1128
		कुल		13876
		बेगंदा	2904	916
		खलबुजुर्ग	2904	0
		निमोला	2048	0
		सुन्देल	2420	396.31
		सेमल्दा	1275	438.46
		रामपुरा	1517	454
		धेगंदा	946	556.13
		रुपट्टा भाग-01	2516	844.25
		रुपट्टा भाग-02	2049	533.61
		देवालरा	1408	876.97
		बायखेड़ा	1970	903.31
		जामन्या	1059	843
		धनखेड़ी	1056	609
		बाकानेर	755	445
		कुवाली	1770	457
		मिर्जापुर	1082	549
		अजन्दा	1898	831
		बड़दा	2369	594
		सिरसाला	1194	780
		लंगुर	1742	741
		सेमल्दा	2124	295

		अजन्दीकोट	2164	707
		बुदियाखेड़ी		0
		माण्डवी	1179	486
		देशवालिया	2367	504
		खण्डवा	2393	659
		लिंगवा	2430	453
		निसरपुर	2122	252
		कुल	15124.04	
चरण-IV (भाग-I)	नहर संभाग (धामनोद)	बेलम बुजुर्ग	1852	568
		उमरिया	1944	763
		जेठवाय	1939	800
		काकट्टी	1812	772
		माचलपुर बुजुर्ग	2003	768
		पिपल्या बुजुर्ग	2235	794
		नागझीरी	2146	785
		बण्डेर	2086	856
		कवडिया	2256	848
		चिंदडिया	2104	705
		चोली	1980	701
		बड़ा	2077	748
		आशापुर	1760	785
		इटावादी	1883	787
		कुल	10680	
चरण-IV (भाग-II)	30 (मनावर)	पलासिया	1866.255	0
		बगवान्या	2181.295	0
		तारापुर	1893.859	0
		रामाधामा	1906.511	0
		उटावद	2009.653	0
		कुवाड	2078.025	0
		बंजारी	2237.066	0
		टोंकी	2092.172	0
		देवला	1921.302	0
		बोरुद	2137.07	0
		बागल्या	2093.725	0
		पचखेड़ा	1663.749	0
		सिंधाना	1817.928	0
		लोहारी	1939.901	0

	धुलसर	2108.489	0
	कुल		0
	महायोग		56052.04

मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनुलग्नक 4 (पेज क्रं 26 से 34) में दी गई है

राज्य/परियोजना स्तर पर परियोजना की निगरानी:

दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा परियोजना की निगरानी की जानी आवश्यक है और समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, हालांकि राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्रमुख मुद्दे:-

- कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन हेतु मंत्रालय से किये गए MOU के हिसाब से कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन में भौतिक प्रगति बहुत कम है फील्ड चैनल के निर्माण में 92170 हेक्टेयर में से सिर्फ 46091 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण हुआ है एवं सूक्ष्म सिंचाई के निर्माण में 54630 हेक्टेयर में से सिर्फ 12773 हेक्टेयर का कार्य ही पूर्ण हुआ है MOU के हिसाब से यह परियोजना 2023-24 में पूर्ण होना है अतः कार्य में तेजी लाना अति आवश्यक है।
- कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन हेतु मंत्रालय से किये गए MOU के हिसाब से कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन में वित्तीय प्रगति भी बहुत कम है वित्तीय प्रगति में भी 648.09 करोड़ में से केवल 113.16 करोड़ का खर्चा हुआ है MOU के हिसाब से यह परियोजना 2023-24 में पूर्ण होना है अतः कार्य में तेजी लाना अति आवश्यक है।
- उपरोक्त परियोजना के Non-Structural Intervention में फंक्शनल ग्रांट एवं इन्फ्रा स्ट्रक्चर ग्रांट में भी प्रगति बहुत धीमी है अतः शीघ्र-अतिशीघ्र फंक्शनल ग्रांट एवं इन्फ्रा स्ट्रक्चर ग्रांट हितग्राही संस्थाओं को प्रदान की जाये।
- पूर्व में बनाई गई फील्ड चैनल का रखरखाव उचित तरीके से न होने से बहुत सी जगह छतियस्त हो गई है एवं इनमें से पानी का रिसाव होता है अतः इनका अच्छे से रखरखाव अति आवश्यक है जिससे भविष्य में भी इनका सही से उपयोग हो सके।
- स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा परियोजना की निगरानी (Concurrent evaluation) की जानी आवश्यक है और समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, हालांकि राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
- परियोजना के चरण-IV भाग -I में सूक्ष्म सिंचाई का कार्य प्रगतिशील है, इसके रखरखाव हेतु इस क्षेत्र में प्रशिक्षण/प्रदर्शन आयोजित किया जाना आवश्यक है परन्तु अब तक WALMI/IMITS द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी प्रशिक्षण/प्रदर्शन/परीक्षण आयोजित नहीं किया गया है।
- परियोजना के चरण-IV भाग -I में जो भी कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का कार्य वर्ष 2023-24 में होना बताया गया है उन सभी में न तो विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है न ही पानी की मोटर को स्थापित किया गया है साथ ही एयर वाल्व भी नहीं लगे हुए हैं।
- निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया है की, कई जगह पर चक को मुख्य नहर से भी नहीं जोड़ा गया है।

- संस्था बाड़ा में चक न. 06 के निकट अनाधिकृत रूप से पानी का उपयोग किया जा रहा है साथ ही पानी की बर्बादी भी हो रही है।

CADWM के कार्यान्वयन में बाधाएं:

वर्तमान में सीएडीडब्ल्यूएम (CADWM) के कार्यान्वयन में कोई प्रमुख बाधा नहीं है,

पूर्व स्थिति रिपोर्ट में की गई सीडब्ल्यूसी अवलोकन की अनुपालन रिपोर्ट।

पिछली निगरानी रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अभी भी NVDA, मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षित है, जिसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

भाग-III/(Part-III)
अनुलग्नक (Annexure)

प्रबोधन यात्रा

परियोजना की यात्रा की तिथि

06/12/2023 से 08/12/2023

प्रबोधन दौरे में भाग लेने वाले अधिकारी

केंद्रीय जल आयोग, भोपाल

1. श्री करण सिंह सैनी, उप निदेशक, प्रबोधन एवं पुनासा निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल.
2. श्री मनीष शर्मा, सहायक निदेशक II, प्रबोधन एवं पुनासा निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश

1. श्री एम. के. शिवहरे कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
2. श्री आशीष शिवहरे कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद,
3. श्री विजय वास्केल अनुविभागीय अधिकारी ओ.एस.पी. नहर उपसंभाग धरमपुरी,
4. श्री विक्रम अवाश्या अनुविभागीय अधिकारी ओ.एस.पी. नहर उपसंभाग धामनोद,
5. श्री एम. सी. गुप्ता उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
6. श्री एम. बी. वर्मा उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
7. श्री एन. के. आर्य उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
8. श्री आनंद जायसवाल उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
9. श्री सुगनचंद जाट अध्यक्ष जल उपभोक्ता संथा क्रमांक 08 बंडेरा
10. श्री आर.पी. उईके, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर
11. श्री गोकुलसिंह चौहान, सहायक यंत्री (मैदानी) नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर
12. श्री आर.के. नैना, उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
13. श्री व्हाय.एस. आकरे, उपयंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
14. श्री दिनेश यादव, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संथा क्र. 01 बेगन्दा

मुख्य विशेषताएं

SALIENT FEATURES OF CAD PROJECT (Omkareshwar Canal)

1	Name of the CAD project. (Whether new/ continuing - Year of inclusion if continuing).	Omkareshwar Canal Project
2	Name of State and CADA implementing the Project.	Madhya Pradesh
3	Name of State, Districts and Blocks served by the Project Command. District wise area served by the Command in thousand hectares.	State -Madhya Pradesh District- Khandwa, Khargone,&Dhar Block -Khandwa 1. Khargone:- Barwaha, Maheshwar & Kasrawad 2. Dhar:- Dharampuri, Manwar & Kukshi
4	Name, designation, address, phone, fax and email of : a. Secretary level b. Chief Engineer level c. Administrator CADA/ SE level officers	A. <u>Secretary Level</u> Mr. Rajnesh Vaish Additional Chief Secretary/ Vice Chairman NVDD/ NVDA 59, Arera Hills, Bhopal – Madhya Pradesh B. <u>Chief Engineer level</u> The Chief Engineer Lower Narmada Projects INDORE (MP) 0731-2552555,2552111 C. <u>NVDA level</u> Director and Advisor Command Area Development Narmada Valley Development Authority, Narmada Bhawan, Bhopal
5	Financial source of the project at State level – Whether State funds or through loans or through corporations.	Cumulative Expenditure on CAD works up-to end of March 2022 Rs. 94.25 Crore.
6	Estimated cost of the CAD project as originally envisaged at the time of inclusion under CAD programme.	Rs . 648.09 Crore.
7	Has the CAD project executed through Foreign assistance at any stage wholly or partly?	No

	If yes details. Area served by the					
8	Area served by the Command in Th. Ha.:					
	Gross Area of the Irrigation Project (Design)		2.14 Lakh ha.			
	CCA of the Irrigation project (Design)		1.46 Lakh ha.			
	Irrigation Potential created at the time of Inclusion under CADP		133271 ha. up-to March 2022			
	Irrigation Potential utilized at the time of inclusion under CADP		16800 ha. (Canal and Pumping by farmers)			
	CCA/IP	At Inception	CCA covered up-to 2021-22	Target Up to 2021-22	2022-23	Remark
	CCA included under the CADP Irrg. Potential created. (Ha.)	-	133271Ha. For Phase-II 15800 ha.	146800 19578	Nil	IP created/target-
	Irrigation Potential Utilized (Ha.)	-	132000 ha. For Phase-II 22560 ha. (Rabi+Kharif)	146800 (Subject to permission for filling of reservoir up-to FRL 19578	146800 19578	Proposed Irrigation


(C.L. ARAKH)

Director com Advisor
Command Area Development Cel
NVDA Bhopal

SALIENT FEATURES OF THE OMKARESHWAR PROJECT (Canal)

1	Location - Name of River basin, Tributary, Irrigation Project, headwork.					Narmada River Basin , 283 thousand hectares (annual irrigation) (CCA=146 thousand hectares phase-II 19.578 th. Ha.) Head work is completed in 2007				
	Type of dam, barrage etc.					Major Dam				
2	Canal Network :									
	A. Main and Branch Canals									
	Canal	Name	CCA (Th. Ha.)	Discharge at head (Cumecs)	No. of direct outlets	Length (Km.)	Portion Lined (km.) (%)	Portion unlined (km.) (%)	No. of days of running on full discharge	Weather volumetric devises/- discharge measuring structures exist on the canals
	Main	OSP	146	102	3670 (tentative)	392	100%	NA	Partial 210 days (Canal is under construction)	Yes
		Phase-II	19.578	50.00	35 Nos	-	100%	NA	Partial 210 days (Canal is under construction)	-
	Branch	-----NI-----								
	B. Distributaries/ Minors/ Sub-minors									
	Canal	Total Length in Km.		Portion Lined (km.) (%)		Portion unlined (km.) (%)		Weather volumetric devises/discharge measuring structures exist		
	Distributaries	1390 km (79 dist.)		100%		-		Presently discharge is being measured with reference to FSD / Fall of canal		
	For Phase- II	15.635 km.		100%		-				
	Minors	600 km.		100%		-		Presently discharge is being measured with reference to FSD / Fall of canal		
	Phase- II	135.33		100%		-				
3	Hydrology of Catchment: Down Stream of Indira Sagar Project									
	Catchment Area	(Sq. Km.) Average	Average Annual	75% dependable	75% yield	Catchment Ground	Total yield	Has the yield been affected		

(Sq. Km.)	Rainfall (mm)	flow with years of assessment MCM	yield (Design) MCM	(present) MCM	water yield (MCM)	MCM	due to upstream development – if so details.
1	2	3	4	5	6	7	8
3238 Sq. Km	1267mm	19383	11665	11665	596.91	11665	Yield affected by up-stream development . Not by
4 Storage:							
Year of first impounding	Gross (MCM)	Dead MCM	Live (MCM)	FRL (m)	Extent of Evaporation losses MCM (% of present yield)	Average Rate of siltation MCM/ year)	Whether rules of operation exists
2007	0.987 B. CuM	0.688 B. CuM	0.299 B. CuM	196.60M	1.34 %	1.50 acre/ feet /sqmile / year	yes
5	Give details of rules of operation:			Work Manual of 1983, of Water Resource Department and its amendments which took place from time to time as per the need			
6	Give no. of structures provided at the time of construction on all canals.			485 nos. (on main canal)			
7	Has the project been revised at any time: Give details			Yes, FourTimes by Central Water Commission. Present cost 4116.22 Crore (Unit II Canal) (P.L- 2014) concurrence by state Govt. of MP vide no. F-31-10/2011/27-1 Bhopal dt – 01.05.2015			
8	Has modernization of the project/ canal been under taken at any stage / give details.			N.A. Project is under construction stage.			
9	If yes, repeat information 1 to 5 for the modernization project.			N.A.			

(C.L. ARAKH)

Director com Advisor
Command Area Development Cell
NVDA Bhopal

CONCURRENT EVALUATION REPORT
OMKARESHWAR (CANAL) PROJECT FOR CADWM

The Omkareshwar Dam has been constructed on River Narmada, downstream of Indira Sagar Project, near village Mandhata of Teshil and District Khandwa at distance 80.00km. from Indore/Khandwa. The Omkareshwar Project (Canal) envisages to provide irrigation facilities in area 1,46,800 ha. of CCA with GCA of about 2,14,204 ha. in District Khandwa, Khargone and Dhar.

Phase wise details of the project, as implemented under AIBP are as below:-

Phase	Works under the phase	Area in ha.	IP Created 3/2021
Phase-I	a) Common water carrier km. 0.00 to km. 12.39	960.00	19794
	b) LBC-km 0 to km. 64.11	20580.00	
	c) RBC -km 0 to 9.770	2460.00	
Phase-II	RBC- km. 9.770 to km 68.92	19578	15800
Phase-III	RBC- km. 68.92 to km 162.70	48592	41257
Phase-IV	RBC- (Lift canal) km. 0.00 to km 125 km.	54630	54630
	Total	146800	131481

Details of command area of the project is as indicated below:-

S. No.	Name of main cana	Off Take	CCA (in ha.)	District Benefitted
1	Common water carrier	Omkareshwar Dam left bank	960	Khandwa
2	Left bank flow canal	12.393km. of CWC	20580	Khargone
3	Right bank flow canal	12.393km. of CWC	70630	Khargone Dhar
4	Right bank lift	From Sisliya balancing reservoir	54630	Khargone Dhar
	Total		146800	

Details of District wise area benefitted are as under:-

S. No.	District	Area (in ha.)	
1	Khandwa	146800	These districts have been indentified for development of CAD work on priority under Prime Minister Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) vide MoWR (SP wing) ref dated 20 July 2015 circulated under ref reducing the gap between Irrigation potential created and Irrigation potential utilization reg.
2	Khargone		
3	Dhar		


Total potential created up to 03/2022 is 133271 ha. and actual irrigation have been done in Kharif session 46229 ha. and Rabi season 87042 ha.

The DPR for CADWM of Omkareshwar (Canal) Project has been approved by Ministry of Water Resources Department, RD and GR CADWM Division, Government of India vide their letter no. G/11011/5/2015/CADWM Dt. 23rd February 2016 to amounting Rs. 648.0898 Crores.

1. Central Assistance for CADWM of OSP (Canal) for all phases have release to amounting Rs. 1665.00 Lakhs vide letter no. F. No.- G/11011/5/2015-CADWM, Government of India, Ministry of WR, RD & GR CADWM Division Dt. 29.03.2016.
2. Central Assistance for CADWM of OSP (Canal) for all phases have release to amounting Rs. 961.25 Lakhs vide letter no. F. No.- G/11011/5/2015-CADWM, Government of India, Ministry of WR, RD & GR CADWM Division Dt. 09.03.2017.
3. Central Assistance for CADWM of OSP (Canal) for all phases have release to amounting Rs. 44.00 Lakhs vide letter no. F. No.- G/11011/5/2015-CADWM/1797-1819 Government of India, Ministry of WR, RD & GR CADWM Division Dt. 18.03.2021.
4. Central Assistance for CADWM of OSP (Canal) for all phases have release to amounting Rs. 1006.50 Lakhs vide letter no. F. No.- G/11011/5/2015-CADWM/725-46 Government of India, Ministry of WR, RD & GR CADWM Division Dt. 21.03.2022.


 (C.L. ARAKH)
 Director cum Advisor
 Command Area Development Cell
 NVDA Bhopal

परियोजना प्राधिकरण का संगठन ढांचा

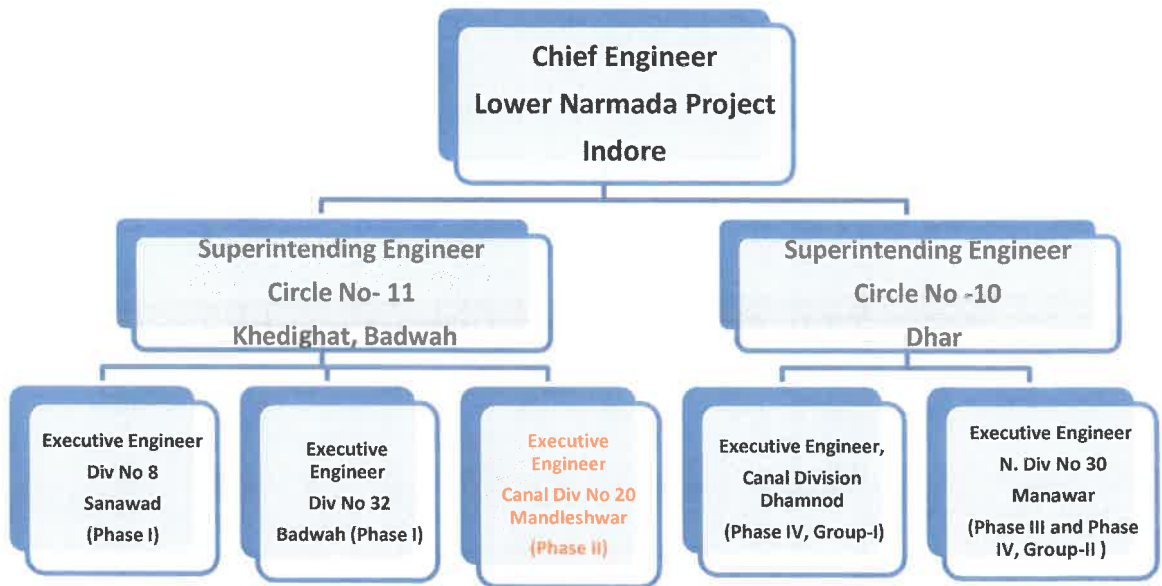

Phase - 1 (Gr-1)

Annexure-1

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER NARMADA VALLEY DEVELOPMENT
DIVISION NO. 32 BARWAHA, DIST.-KHARGONE (M.P.)

CADWM Work Details : WUA. 01 Morghadi & WUA. 02 Moralla

OMKARESHWAR PROJECT (CANAL) PHASE-I, Madhya Pradesh :-

(Financial Amount in Lakh)

S.N o.	Activities	Total Quantum of Work Involved		Achieved Up to march 2023		2023-24 Achievement (Till December 2023)		Cumulative Achievement up to 2023-24 (Till December 2023)		Target for 2023-24 April -2023 to march-2024		Target for 2024-25 April -2024 to march-2025	
		Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	Survey and planning (Ha)	3035	36.42	3035	36.42	-	-	3035	36.42	-	-	-	-
2	Field channel (pucc) (Ha)	2017.31	504.32	2017.31	504.32	-	-	2017.31	504.32	-	-	-	-
3	Land levelling (Ha)	212.85	106.41	-	-	-	-	-	-	212.85	106.41	-	-
4	Micro irrigation (Ha)	1017.69	357.60	-	-	-	-	-	-	1017.69	357.60	-	-
5	Field drains (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Reclamation of water-logged area (Ha) Surface Drainage/bio drainage	79.90	15.98	-	-	-	-	-	-	79.90	15.98	-	-
7	Reclamation of water-logged area (Ha) Sub Surface Drainage	79.90	39.95	-	-	-	-	-	-	79.90	39.95	-	-
8	Functional grant (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Infrastructural grants (No.)	2.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2.00	6.00	-	-
10	Training (No.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Adaptive Trials (No.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total :-	6444.65	1066.68	5052.31	540.74	0.00	0.00	5052.31	540.74	1392.34	525.94	0.00	0.00

EXECUTIVE ENGINEER
N. D. DIVISION NO. 32
BARWAHA, DIST. KHARGONE (M.P.)

अनुलग्नक-IV

भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति (फेज I)

भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति (फेज I)

Phau -1 (Gr-II)

ऑन कारेश्वर परियोजना (नहरें) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन
दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 की स्थिति में

सं. क्र.	संभाग का नाम	कुल कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर में)	पिछले माह एक पूर्ण कमाण्ड विकास कार्य का रकबा	इस माह में पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर में)	संच कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर में) (9-11)	संच कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर में) (12-24)	वर्ष (2023-24) में पूर्ण कार्य (हेक्टर में)	प्राप्त आबंटन (लाख में)	निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी			मासिक सिंचाई द्वारा विकसित कमाण्ड क्षेत्र (हे. में)	रिमाक
									कार्य (चक संख्या)	निर्मित कुल कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टर में) (4+5)	व्यय राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क. 8 सनायद	20580	8219.66	0.00	12360.34	12360.34	0.00	1493.80	0	8219.66	1319.09	-	-


कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग कमाण्ड-8,
सनायद

भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति (फेज II)

Phase - II

AM. WWA. (10 No.)

Annexure-I

CWC Report

dt-7-11-2023

CADWM Works Details

Rs. Lakh

Omicareshwar Project Canal Phase-II														Rs. Lakh	
S. NO.	Activities	Total Quantum of Work Involved			Achieved Up to march 2023		2022-23 Achievement (Till March 2023)		Cumulative Achievement up to 2022-23 (Till March 2023)		Target for 2023-24		Target for 2024-25		
		Physical	Financial	Physical	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Survey and Planning (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Field Channel (Paces) (Ha)	15800	2370	12530	1879.5	-	-	12530	-	2105	527.30	1165	291.83		
3	Land Levelling (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Micro Irrigation (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Field drains(Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Reclamation of water-logged area(Ha) Surface Drainage-two drainage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Reclamation of water-logged area(Ha) Sub Surface Drainage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Functional grant (Ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Infrastructural grants (No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Training (No.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Adaptive Trials (No.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(M.K. Shivhare)
Executive Engineer,
N.D. Division No.20,
Mandleshwar (M.P.)

भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति (फेज III)

कार्यालय कार्यालयन वंत्री नर्मदा विकास संस्थान ३६, ३० नर्मदा
मार्ग ६६, विमान मार्गन मोरवा, की. मार्गन की आवासी (मार्ग ३० नर्मदा २०२३) की विपरीत की आवासी-३

Sl. No.	Candidate's Name	Roll No.	Date of Birth	Gender	Religion	Caste	Father's Name	Mother's Name	Marital Status	Educational Qualification	Marks in Entrance Exam	Rank	Status	Remarks
1	ABHIRAM K	1001	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1001	Selected	
2	ABHIRAM K	1002	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1002	Selected	
3	ABHIRAM K	1003	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1003	Selected	
4	ABHIRAM K	1004	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1004	Selected	
5	ABHIRAM K	1005	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1005	Selected	
6	ABHIRAM K	1006	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1006	Selected	
7	ABHIRAM K	1007	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1007	Selected	
8	ABHIRAM K	1008	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1008	Selected	
9	ABHIRAM K	1009	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1009	Selected	
10	ABHIRAM K	1010	10/01/2000	M	H	SC	ABHIRAM K	ABHIRAM K	Married	B.A.	45.50	1010	Selected	

मार्गदर्शन पत्र
मार्गदर्शन पत्र 30

Phase - IV (Gr-I)

Omkarshwar Canal Project Phase - IV Gr.-I

(Rs. in lakhs)

S. No.	Activity	Total Quantum of Works Involved		Achievement up to March 2023		2023-24 Achievement (Till November 2023)		Cumulative Achievement up to 2023-24 (Till November 2023)		Target for 2023-24		Target for 2024-25	
		Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	Survey and Planning (Ha.)	28073	336.88	5543	66.52	0	0	6445	77.34	10000	120.00	10000	120.00
2	Field Channels (Pacca) (Ha.)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
3	Land Levelling (Ha.)	1404	702.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1404	702.00
4	Micro Irrigation (Ha.)	28073	14036.50	5543	1213.15	902	497.34	6445	1710.49	10000	5000.00	10000	5000.00
5	Field Drain (Ha.)	5620	337.20	0	0	0	0	0	0.00	0	0	5620	337.20
6	Reclamation of water-logged area (Ha.) Surface Drainage/bio drainage	561	112.20		0	0	0	0	0.00	0	0	561	112.20
7	Reclamation of water-logged area (Ha.) Sub-Surface Drainage	561	280.50	0	0	0	0	0	0.00	0	0	561	280.50
8	Functional Grant (Ha.)	28073	336.88	0	0	0	0	0	0.00	0	0	28073	336.88
9	Infrastructure Grants (Nos.)	14	42.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	14	42.00
10	Training (No.)	14	12.60	0	0	0	0	0	0.00	0	0	14	12.60
11	Adaptive Trials (1000 Ha. Each)	28	14.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	28	14.00
Total for OSP Phase IV Group -I			16210.75		1279.67		508.16		1787.83		5120.00		6957.38

(A.M. Shrivhare)
Executive Engineer
OSP Canal Division dharmad

भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति (फेज IV)

कार्यालय कार्यापालन यंत्री गर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर

प्राप्त :- 30 नवम्बर 2023

[illegible]

कार्यपालन समिती
नर्मदा विकास संभाग क्र. 30
मनावर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद जिला-धार (म.प्र.)

स.क्र.	जल उपभोक्ता संस्था का क्रमांक एवं नाम	बक न.	टी.सी. नम्बर	नहर का नाम	रकबा हेक्टर में	तकनीकी स्वीकृति राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7
1	1 बेलम बुजुर्ग	141	5	निमसीरी SM / नगया माइनर -2	39.85	19.86
2	2 उनरिया	128	6	नाया SM / नगया माइनर -2	32.512	16.76
3	3 जेटवाय	31	4	पलास्या माइनर	40.282	20.03
4	4 काकट्टी	6	10	चिमनी Dy	24.084	11.77
		6 (A)	11	चिमनी Dy	25.017	12.13
5	5 माचलपुर बुजुर्ग	57	4	माचलपुर माइनर-1 / चिमनी Dy	40.63	20.28
6	6 पियलवा बुजुर्ग	2	5	ठणी माइनर-2	29.577	14.64
7	7 नागसीरी	DOL-4	1	DOL	40.948	20.44
8	8 बण्डेरा	DOL-8	2	DOL	29.169	14.37
9	9 कवडिया	3	4	गुलाबड़ माइनर	39.685	19.58
10	10 चिंदडिया	21	11	हरसगाँव Dy	31.27	15.18
11	11 चोली	38	8	चौली माइनर	30.61	18.05
		6	2	समराज DY	36.373	17.89
12	12 बड़ा	5	10	करियाखेड़ी Dy	25.35	18.95
		19	11	इटाबदी माइनर	38.39	20.06
		6	10	करियाखेड़ी Dy	36.56	19.93
13	13 आशापुर	2	10	मेलखेड़ी माइनर	29.679	12.44
		5	7	सातनुर Dy	35.882	18.39
14	14 इटाबदी	41	8	कोलीखेड़ा माइनर	34.452	17.03

(ए.एम. शिवहरे)

कार्यपालन यंत्री

ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद

औंकारेश्वर परियोजना चरण-4 समुह-2 की जल उपभोक्ता संस्थाओं का विवरण

स.क्र	संस्था क्रमांक एवं नाम	क्षेत्रिया	माईनर
1	2	3	4
1	15-पलासिया	1866 Ha. 1 Nos	पलासिया DY
2	16-बगवान्या	2181 Ha. 4 Nos	सनकोटा माईनर, कुसुमला माईनर, डापला माईनर, तालाबपुरा माईनर
3	17-तारापूर	1894 Ha. 1 Nos	भवान्याकला DY
4	18-रामाधामा	1907 Ha. 4 Nos	छितरी माईनर-1, छितरी माईनर-2, भुरियाकुआ DY, इब्राहिमपुरा माईनर
5	19-उटावद	2010 Ha. 3 Nos	भुरियाकुआ DY, रालामण्डल माईनर-1, रालामण्डल माईनर-2
6	20-कुवाड	2078 Ha. 3 Nos	भुरियाकुआ DY, हनुमन्त्या DY, घनखेडी माईनर
7	21-बंजारी	2237 Ha. 4 Nos	भुरियाकुआ DY, घनखेडी माईनर, बंजारी माईनर, जाटपुर DY
8	22-टोंकी	2092 Ha. 3 Nos	अजन्दीमान DY, जाटपुर DY, जगन्नाथपुरा माईनर-1
9	23-देवला	1921 Ha. 4 Nos	लिम्बी DY, जगन्नाथपुरा माईनर-1, जगन्नाथपुरा माईनर-2, जाजमखेडी माईनर
10	24-बोरुद	2137 Ha. 4 Nos	लंगुर DY, लिम्बी DY, झापडी माईनर-1, झापडी माईनर-2,
11	25-बागल्या	2094 Ha. 2 Nos	अजन्दीमान DY, लिम्बी DY,
12	26-पचखेड़ा	1664 Ha. 3 Nos	लंगुर DY, लिम्बी DY, सिंघाना माईनर
13	27-सिंघाना	1818 Ha. 5 Nos	टेल DY, लंगुर DY, सिंघाना माईनर, दसवी माईनर, अजनिथा माईनर
14	28-लोहारी	1940 Ha. 1 Nos	टेल DY
15	29-धुलसर	2108 Ha. 1 Nos	टेल DY
		29947 Ha.	

कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्र. 30
मनावर

ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना के सभी चरणों की संयुक्त भौतिक प्रगति


		Physical Target as per MoU	Physical progress
1	Structural intervention		
a.	Survey, Planning & Design (ha)	146800	58864
b.	OFD Works		
	i.) Construction of lined filed channels (ha)	92170	46091
	ii) Micro Irrigation	54630	10680
	iii.) Mechanized land levelling	7340	500
c	Construction of filed intermediate and link drains. (ha)	29630	100
d	Correction of system deficiency.		
e	Reclamation of Water-logged area.		
	i)Surface drainage	2936	500
	ii)sub-Surface drainage	2936	500
	Total structural interventions		
2	Non-Structural Interventions		
a	One time grant to registered /elected Water Users Association (WUA)		
	i.) Functional grant (Rs.Cr.)	146800	500
	ii.) Infrastructure grant (Rs.Cr.)	87	75
b	Adaptive Trials (No.)	147	29.4
c	Demonstration (No)		
d	Trainings (No.)		
e	Monitoring & Evaluation (ha)		
f	Action Research (No.)		
g	Establishment		
h	Grant to WALMI		
	Total Non-structural Interventions		
	Total		

भाग-IV/(Part-IV)


प्लेट्स (Plates)

प्लेट-I सम्पूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास घटक का मानचित्र

PLATE - I

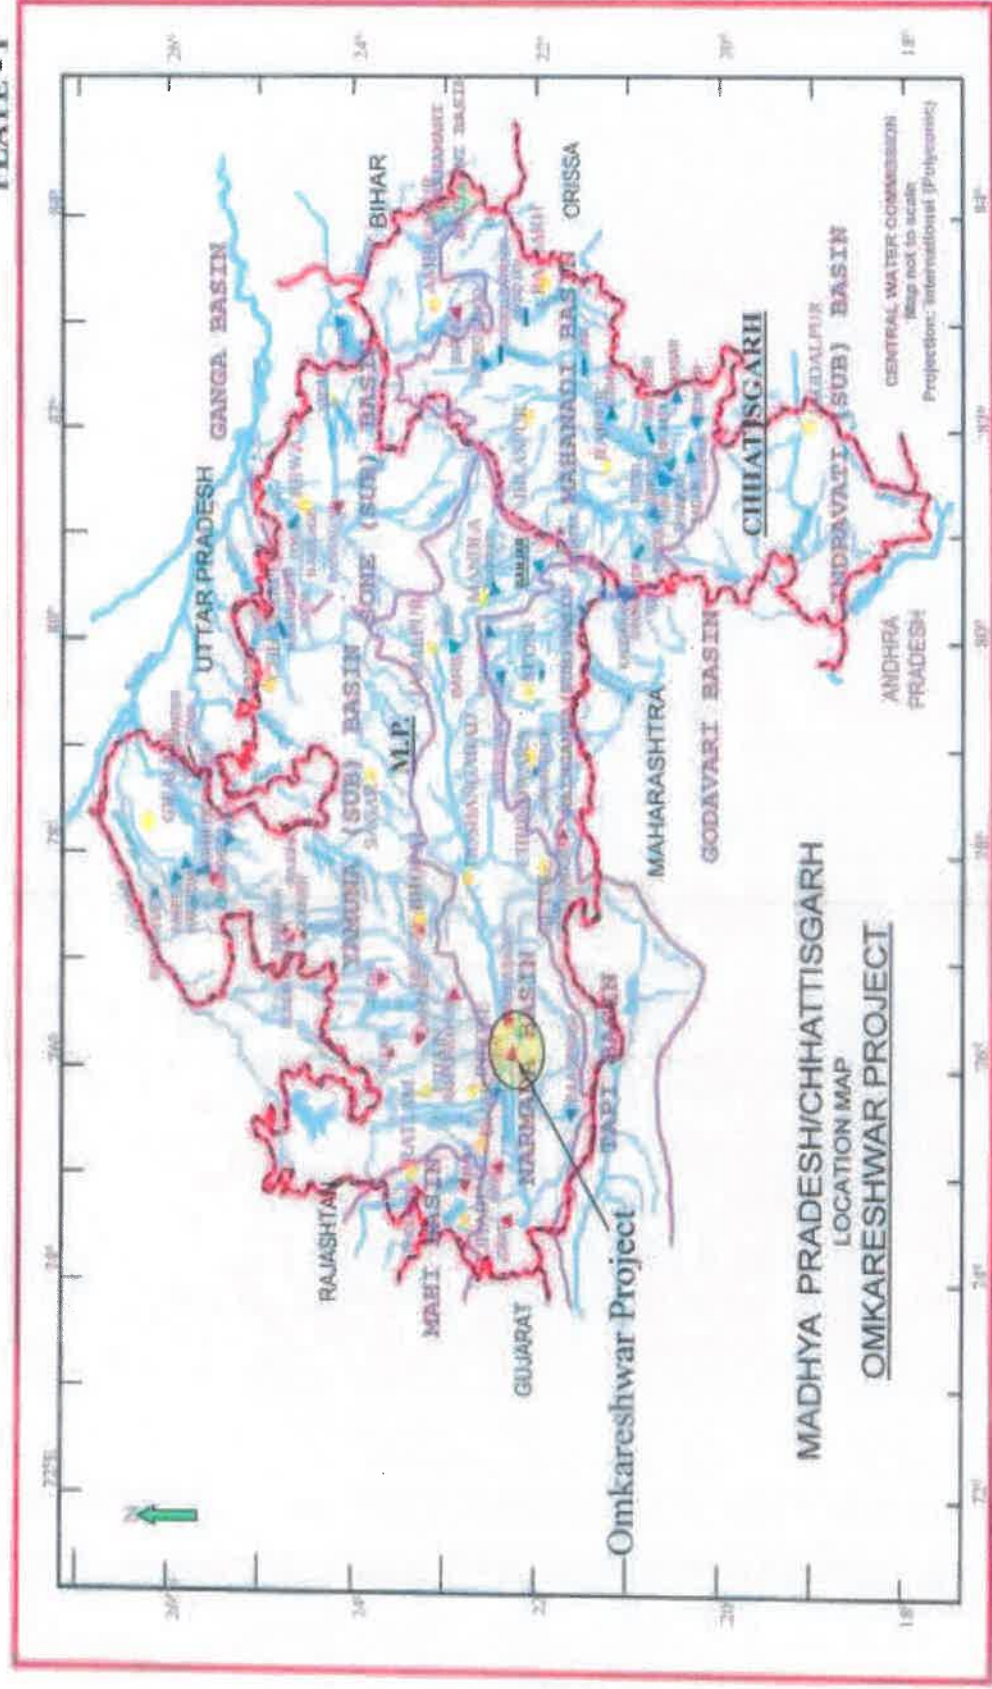


प्लेट-II सम्पूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना लेआउट प्लान

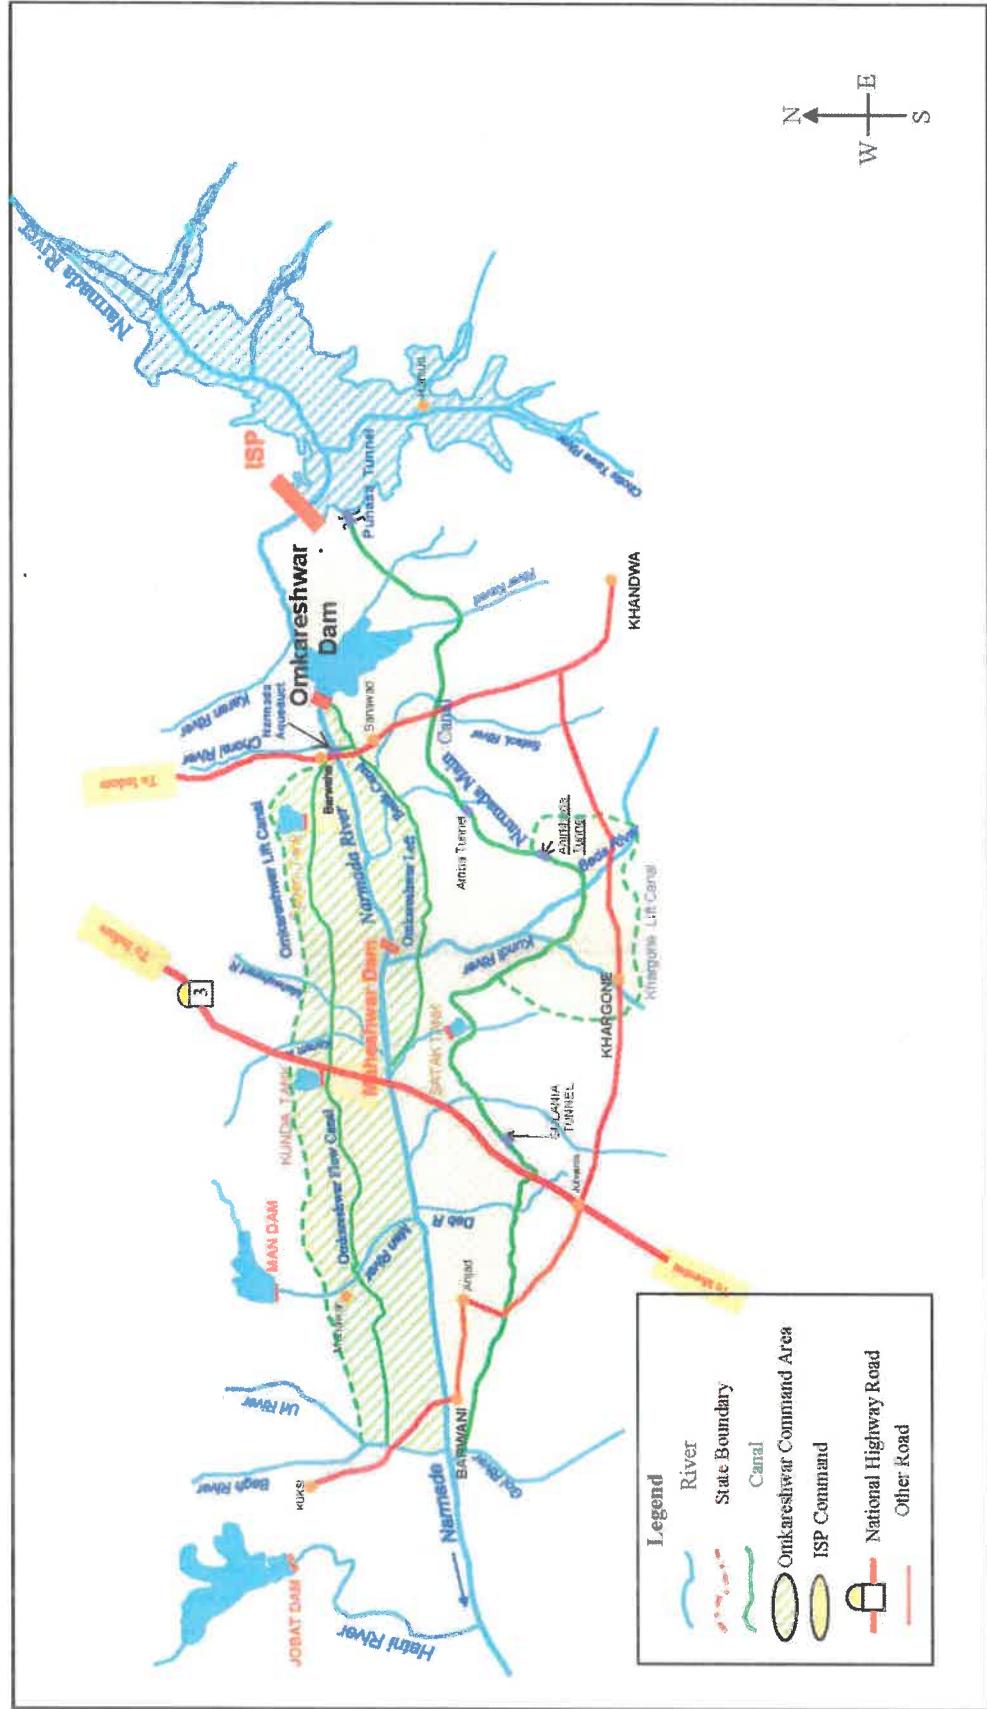

प्लेट-III सम्पूर्ण ओम्कारेश्वर सिंचाई परियोजना (फेज I से IV)

INDEX MAP OF OMKARESHWAR PROJCTET CANAL SYSTEM

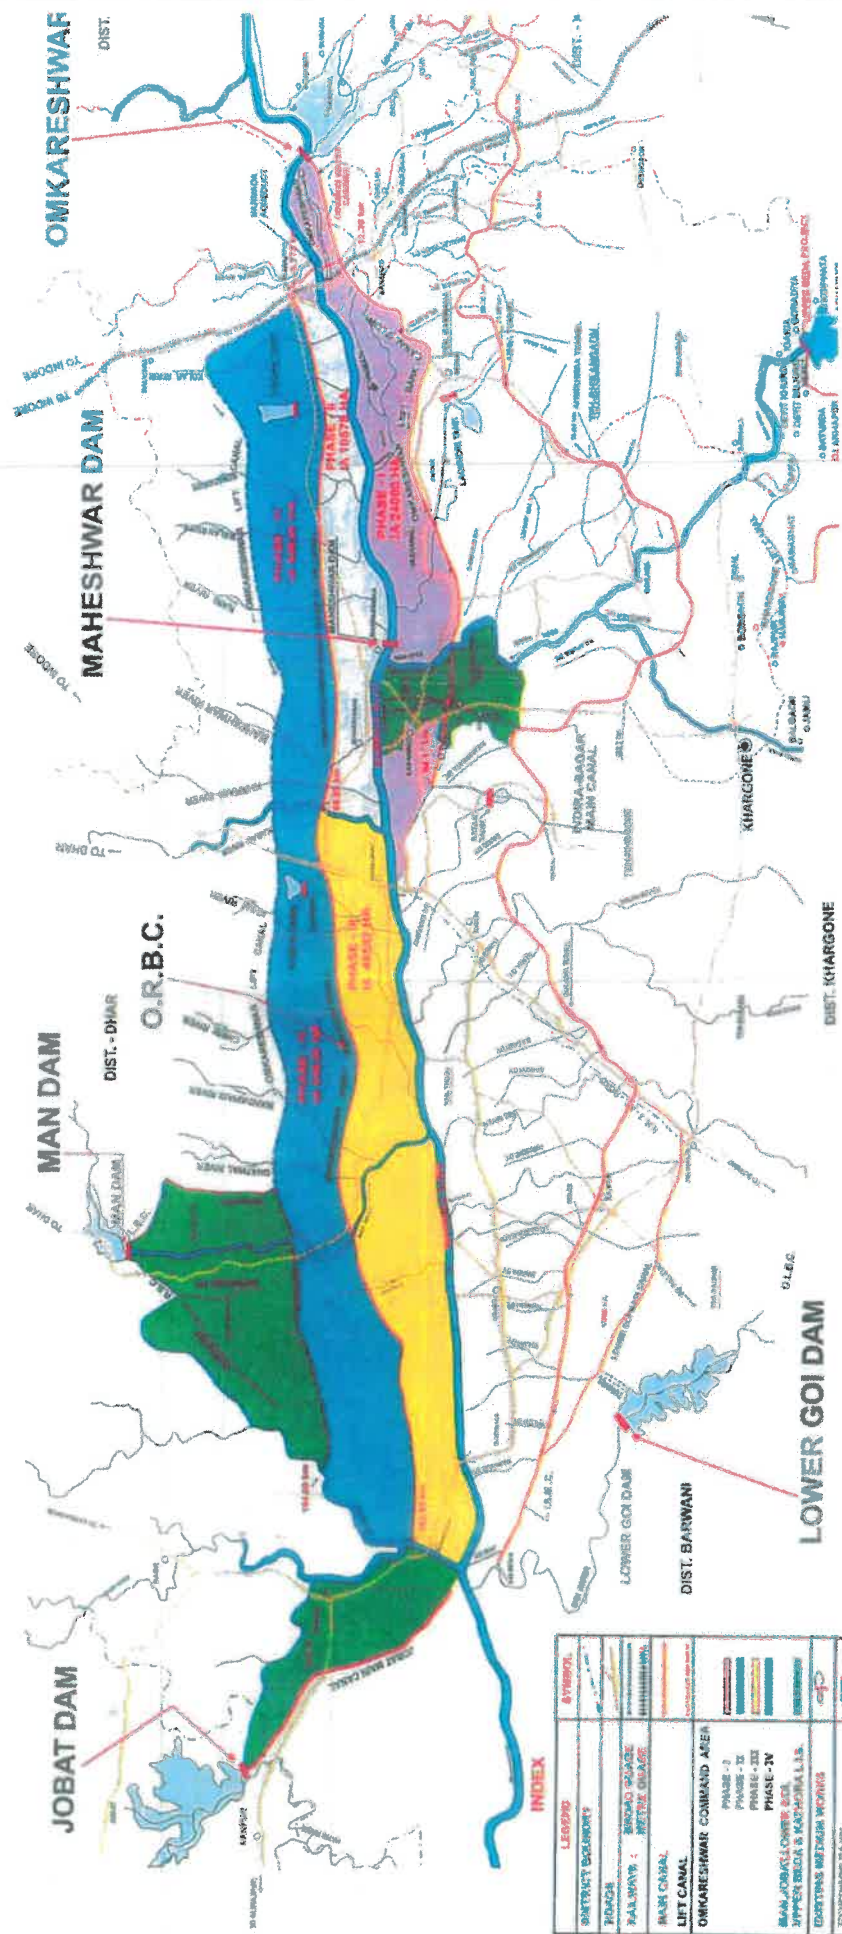

भाग-V/(Part-V)

छायाचित्र (Photograph)



फेज-IV, संस्था बाड़ा चक क्र. 05



फेज-IV, संस्था बाड़ा चक क्रं. 06

फेज-IV, संस्था बाड़ा (अधिकारियों से चर्चा करते हुए)

		
 06 Dec 2023 02:09 pm clear sky 29.0	 Chakmahetwada, Madhya Pradesh 451224, India 06 Dec 2023 02:10 pm clear sky 29.0	 Maheshwar Shree Omkaardutta Heritage CITY Maheswar, 06 Dec 2023 02:21 pm clear sky 29.0



